Diagrama de Gantt · RescueSync


Entregas 1 a 3 con las tareas del grooming, horas estimadas contra reales y desvío, y la etapa restante hasta el coloquio. Dato fuente: proyecto DSSD en Jira (SCRUM-5 a SCRUM-86).

Tarea finalizada · No realizada · Por planificar · Entrega o hito

ENTREGA	TAREAS	ESTIMADAS (H)	REALES (H)	DESVÍO (H)
Entrega 1 · Modelo de proceso en Bonita	18	20,5	sin dato	—
Entrega 2 · Aplicación web e integración inicial con Bonita	34	46	95,2	−2,2
Entrega 3 · Sistema Nacional en la nube e integración	26	74	86,5	−2,5
Total	**78**	**140,5**	**181,7**	**−4,7**

El desvío (reales menos estimadas) se calcula solo con las tareas que tenían estimación; negativo significa que llevó menos de lo previsto.

ACTIVIDAD	EST. H	REAL H
ENTREGAS E HITOS		
Entrega 1 Modelo de proceso en Bonita	**20,5**	—
Lectura conjunta del enunciado	1,5	—
Investigación del uso de Bonita	1	—
División de módulos entre integrantes	0,5	—
Modelado: Registro de Emergencia	1,5	—
Modelado: Generación de Lotes	1,5	—
Modelado: Convocatoria y Ofertas Colaborativas	2	—
Modelado: Validación Externa y Asignación Flexible	2	—
Modelado: Adjudicación y Notificación	1	—
Modelado: Compromiso Nacional	1	—
Modelado: Ejecución, Finalización y Cierre Bilateral	1,5	—
Puesta en común de los diagramas individuales	1,5	—
Integración en un único flujo end-to-end	1	—
Revisión de conexiones y puntos de quiebre	1	—
Incorporación de temporizadores	0,5	—
Incorporación de eventos alternativos	0,5	—
Revisión y ajuste fino del modelo completo	1	—
Identificación de tareas pendientes para Entrega 2	1	—
Estimación de esfuerzo por tarea	0,5	—
Entrega 2 Aplicación web e integración inicial con Bonita	**46**	**95,2**
Elección de arquitectura	1,5	1,3
Diseño de Base de Datos	2	4/5
Setup Docker BD	4	3
Crear archivo de inicialización de la base de datos	—	1,3
Inicialización del Backend	4	3
Inicialización del Frontend	4	3
Crear usuarios (Bonita)	—	1,30
Login usuarios (Backend)	6	2
Login usuarios (Frontend)	4	2
Registro usuarios (frontend)	2	N/R
Formulario de Alta de Emergencia	3	3
Alta de Emergencia: endpoint (backend)	—	5
UI: Publicación de Lotes	4	6
Publicación de Lotes: endpoint (backend)	—	10
Formulario de Carga de Ofertas	4	4
Carga de Ofertas: endpoint (backend)	—	3
Trazabilidad de Ofertas	—	2
Contratos en Bonita Studio	1,5	1
Integración del registro de emergencia con API REST de Bonita	4	7
Integración del registro de lote con API REST de Bonita	—	5
Implementación de notificaciones	—	3
Edición y retiro de ofertas	—	3
Ofertas parciales y en consorcio	—	2
Listados y detalle por perfil	—	2
Navegación y manejo de sesión	—	1
Control de acceso por rol	—	1,3
Mejoras de UI y manejo de errores	—	2
Pruebas unitarias del backend	—	1
Actualización del modelo en Bonita	—	2
Refactor del proyecto	—	2
Correcciones de Docker y entorno	—	2,5
Integración de ramas y corrección de errores	—	2
Documentación del proyecto	—	2
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos	2	2
Entrega 3 Sistema Nacional en la nube e integración	**74**	**86,5**
Definición del alcance y contratos de la API	2	4
Inicialización del proyecto y repositorio	4	1
Diseño de base de datos	4	3
Carga de datos de ejemplo	2	2
Login con JWT	6	6
Gestión de cuentas de ONGs	6	6
Catálogos de consulta	3	3
Investigar locking en PostgreSQL	1	1
Control de concurrencia y bloqueo	5	5
Liberación y cierre	4	4
Manejo de errores y validaciones	2	2
Pruebas de los endpoints	4	4
Documentación con Swagger	4	3
Investigar despliegue con Docker en Render o Heroku	2,5	2
Crear Dockerfile	2	2
Despliegue en la nube	5	5
Endpoint de ofertas consolidadas (aplicación local)	3	3
Integración con Bonita	6	6
Recepción de ofertas en el Sistema Nacional	—	4
Registro de la validación nacional en la aplicación local	—	3
Decisión municipal sobre las ofertas validadas	—	4
Liberación de recursos en la aplicación local	—	3
Documentación de la entrega	2	3
Reuniones de seguimiento	4,5	4,5
Unificar procesos en Bonita	—	1
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos	2	2
Entrega 4 y Final Actividades restantes por definir	**—**	**—**

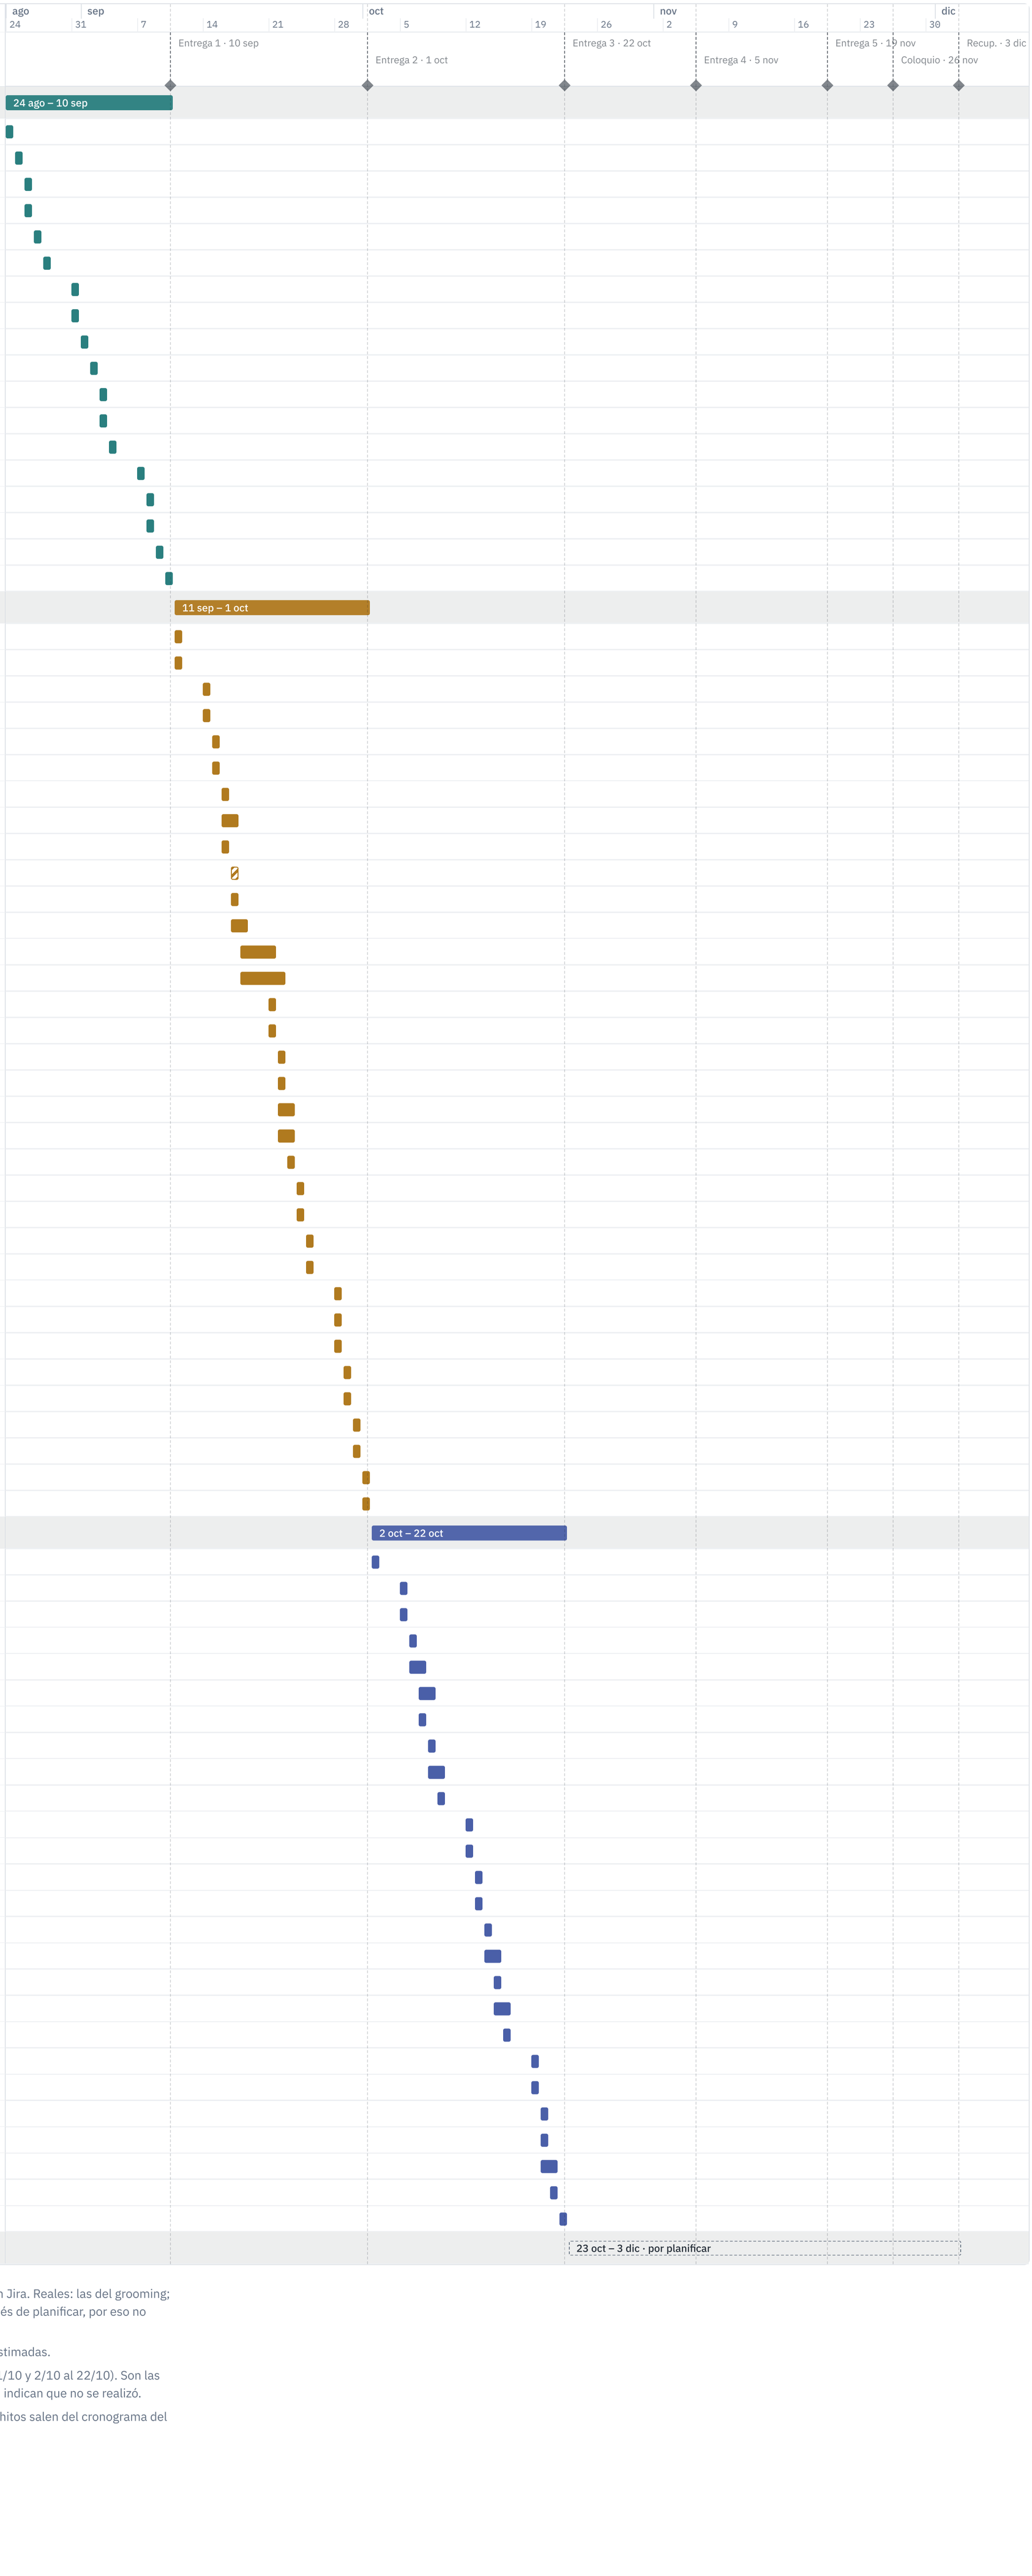

Horas. Estimadas: las del grooming, redondeadas a media hora, igual que los Story points en Jira. Reales: las del grooming; "4/5 h" cuenta como 4,5 h para calcular el desvío. Una tarea sin estimación (—) surgió después de planificar, por eso no tiene desvío.

Entrega 1. El grooming de esa etapa no registra horas reales, así que se muestran solo las estimadas.

Fechas. Las tareas se reparten dentro de la ventana de cada entrega (24/8 al 10/9, 11/9 al 1/10 y 2/10 al 22/10). Son las mismas fechas cargadas en Jira. La barra rayada y el "N/R" de "Registro usuarios (frontend)" indican que no se realizó.

Entrega 4 y Final. Sus tareas todavía no están definidas. El tramo va del 23/10 al 3/12 y los hitos salen del cronograma del enunciado.
